



# **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL**



---

## **RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS**

**PLANES 2017-2024**  
OUTUBRO DE 2022

---

**SEGEP**



---

## 1 INTRODUÇÃO

---

GCPLANES é um ambiente de monitoramento do Planejamento Estratégico o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (PLANES) concebido por iniciativa da Seção de Gestão Estratégica e Projetos do Estado-Maior-Geral (SEGEP) com intuito de fornecer de forma fácil e centralizada, dados e informações a execução do PLANES 2017-2024 da corporação.

Este ambiente foi estruturado sob o conhecimento e ótica da SEGEP/EMG, como uma ferramenta de apoio para fornecimento de subsídios aos ajustes necessários à execução do Plano Estratégico, bem como para melhoria dos processos decisórios da gestão estratégica institucional.

Este relatório capta, centraliza e organiza em forma de tabelas e dashboards os dados e informações do monitoramento e execução dos projetos estratégicos cadastrados no GPWEB – Sistema de Gestão Estratégica alinhada com gerenciamento de projetos, por intermédio dos gerentes de projetos.

Sendo assim, o documento em lide tem o objetivo de dar transparência sobre a execução do PLANES além de fornecer informações individualizadas e setoriais sobre o emprego sobre o emprego da metodologia preconizada para gestão dos projetos, os percentuais de desenvolvimento dos projetos e os reports apontando status atualizado e situações específicas.

Desta forma, o relatório constitui uma ferramenta gerencial capaz de apoiar tanto a prestação de contas quanto o processo decisório estratégico.



## 2 MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico é uma representação estruturada de forma resumida e visual do PLANES 2017-2024. Tem como principal objetivo criar um fluxo de entendimento de como atingir os objetivos nele descritos. Tendo como premissa a metodologia do Balanced Scorecard (BSC), apresenta também a construção de nossa cadeia de valor em função das perspectivas do BSC, tendo como cliente a população do DF.








## 4 EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

Os Projetos Estratégicos obtiveram uma execução total de 52.99%. O valor representa a média dos resultados obtidos na execução dos 21 projetos estratégicos. O painel abaixo expõe a realização até 2022, comparada as faixas de avaliação vermelha (abaixo de 25%), amarela (entre 25% e 80%) e verde (acima de 80%). Os Projetos Estratégicos do CBMDF, para os anos 2017-2024 estão na faixa amarela, na medição realizada em 25 de Outubro de 2022.

A situação geral quanto ao monitoramento do resultado alcançado está disposto no painel abaixo.

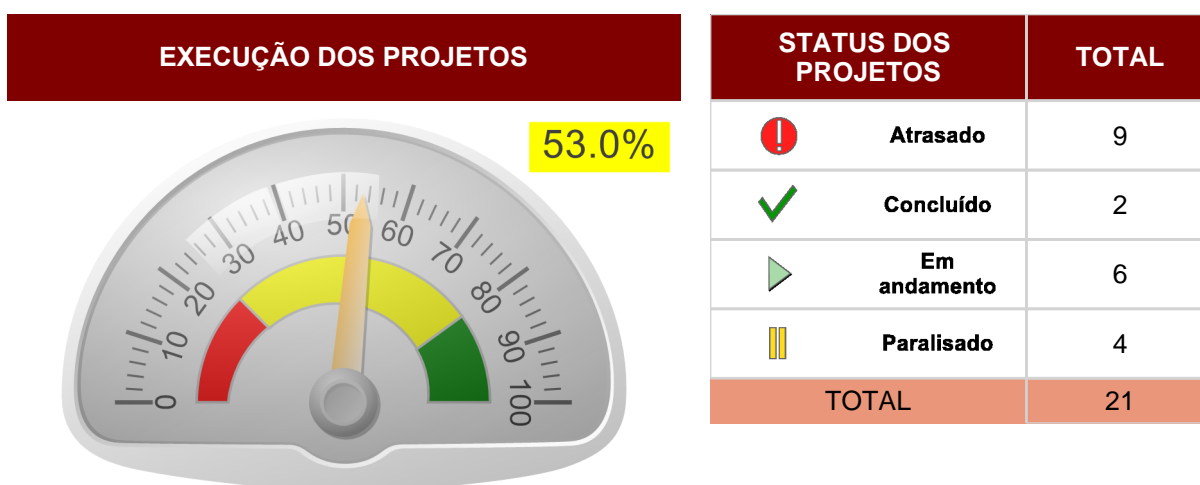





## 4.2 Resultados dos Projetos Estratégicos

Os resultados referentes a cada projeto estratégico estão demonstrados na tabela abaixo.

PROJETO	OBM	ADESÃO À METODOLOGIA	STATUS DO PROJETO
Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)	COGER	80.00%	Atrasado (49.41%)
Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia	COMAP	80.00%	Atrasado (72.92%)
Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)	COMAP	80.00%	Atrasado (14.89%)
Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães	COMAP	80.00%	Atrasado (94.79%)
Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural)	COMAP	80.00%	Atrasado (4.27%)
Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente	COMAP	60.00%	Atrasado (8.75%)
Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM	COMAP	80.00%	Paralisado (78.55%)
Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP	COMAP	80.00%	Em andamento (68.21%)
Credenciar o CBMDF como Instituição de Ensino Superior	GABCG	25.00%	Atrasado (0.00%)
Implantação da Gestão de Riscos na DITIC.	DITIC	75.00%	Concluído (100.00%)
Implantação da Gestão de Riscos no DERHU.	DERHU	F2%	Em andamento (75.47%)
Implantação da Gestão de Riscos no DESEG.	DESEG	100.00%	Concluído (100.00%)
Implantação do Sistema SCIPWEB	DESEG	100.00%	Em andamento (98.42%)
Implantar a Gestão de Riscos - DISAU	DISAU	25.00%	Paralisado (0.00%)
Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD	EMG	100.00%	Paralisado (55.91%)
Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)	DITIC	80.00%	Em andamento (60.45%)
Projeto de Lei Bombeiros Temporários	EMG	75.00%	Atrasado (76.41%)
Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 16º GBM - Gama	COMAP	100.00%	Em andamento (44.20%)
Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília	COMAP	80.00%	Em andamento (60.98%)



Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho	COMAP	80.00%		Atrasado (0.39%)
Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP	COMAP	75.00%		Paralisado (48.75%)



---

## **5 DESEMPENHO PORMENORIZADO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS**

---

Além do monitoramento da execução dos projetos estratégicos, a SEGEP /EMG também produziu informações de monitoramento de cada um dos 21 projetos estratégicos corporativos.

A aferição da execução de cada projeto é apresentada na forma de indicador de execução, tabela de desempenho por Etapas/Tarefas e o último registro de conferência e acompanhamento geral de cada projeto.

O indicador reflete o desempenho no período de 2017 a 2024. Os valores apresentados são cumulativos até o encerramento do projeto, sendo que em 2024 completa-se este ciclo estratégico e o percentual máximo atingível é 100% dos projetos realizados.

A tabela apresenta o andamento por cada Etapa e Atividade associada ao projeto previamente detalhado, onde são apresentados o Status de execução, a data de início e término.





## 5.1 Detalhamento dos Projetos Estratégicos



49.41%

**PROJETO:**
← ATRASADO

**Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)**


<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.06 Ampliar as parcerias para o combate ao incêndio florestal
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COGER
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CAP QOBM/Compl Melo
<b>PROCESSO SEI</b>	

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Ampliar a oferta e integração de outros serviços prestados pela SES-DF e CBMDF	Disciplinar em instrumento próprio a participação do CBMDF no apoio ao Sístea de Tranposte de Órgãos.	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
Atuar de forma integrada com equipe mista de intervenção no SUAPH	Manter o serviço aeromédico com guarnição compartilhada no helicóptero do CBMDF	CONCLUÍDA	10/26/2020	12/31/2021
Atuar de forma integrada em ocorrências de vulto e grandes eventos	Elaborar e implantar protocolo para deslocamento de equipes e unidades móveis, para além dos limites do Distrito Federal e Entorno	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Elaborar parâmetros e protocolos para atuação conjunta em situações especiais tais como catástrofe, incidentes com agentes químicos, biológicos, radiológicos e nucleares dentre outros	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Estabelecer parâmetros e protocolos para atuação conjunta em operações em eventos com grande concentração de público	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Estabelecer parâmetros e protocolos para atuação conjunta em situações de múltiplas vítimas	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
Elaborar estudo de viabilidade para a modificação de Unidades de Resgate do CBMDF em Unidades de Suporte Básico de Vida medicalizadas, utilizando técnicos do SAMU na composição da equipe, e para a melhoria de Unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU com	Elaborar estudo de viabilidade para a modificação de Unidades de Resgate do CBMDF em Unidades de Suporte Básico de Vida medicalizadas, utilizando técnicos do SAMU na composição da equipe, e para a melhoria de Unidades de Suporte Básico de Vida do SAMU com	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
Integrar comunicações e registros de dados do serviço integrado de APH	Compartilhar informações de despacho e deslocamento das ambulâncias	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Implantar arquivo médico único no SAMU192 contendo os prontuários médicos e as fichas de atendimento do SUAPH e CERU	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Implantar fichas de atendimento padronizadas no SUAPH	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021







ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Integrar comunicações e registros de dados do serviço integrado de APH	Realizar o registro e armazenamento de dados de forma integrada	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
Integrar os trabalhos da Central de Regulação de Urgências - CERU e COCB	Adequar as instalações físicas e infraestrutura das Centrais no prédio do Centro Integrado de Operações de Brasília - CIOCB	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Adequar estrutura T.I. para gravação das ocorrências e armazenamento das informações	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Iniciar os despacho de recursos do SAMU pela COCB	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Iniciar os trabalhos de teleatendimento do telefone 192 e 193 de forma integrada pela COCB	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
Realizar a regulação média de todas as ocorrências do SUAPH	Confeccionar e ampliar protocolos de despacho imediato	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021
	Confeccionar e ampliar protocolos de regulação médica	ATRASADA	10/26/2020	12/31/2021

## ADESÃO À METODOLOGIA

 80.00% (4/20/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗

 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO
---	---	---	---

## ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

20/04/2022

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Projeto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 151, de 12 de agosto de 2020, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e permaneceu assim no BG 228/20\_ entrega 22, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)". Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021. O projeto está relacionado à iniciativa 1.6 do PLANES.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** CAP QOBM/Compl. Inácia Melo, conforme BG 56/2021.

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** Possui TAP, cronograma e EAP no GPWeb. Projeto encontra-se em atraso conforme cronograma e o último report de 31/12/2021. O nome do projeto está correto "Central SUAPH - Integração dos trabalhos da Central de Regulação de Urgências do SAMU192 (CERU) e da Central de Operações e Comunicações do CBMDF (COCB)", na última publicação que ocorreu no BG 56 ele continuou como projeto estratégico, mas já havia sido publicado no publicado no BG 228, com entrega para 2022, e foi incluído no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do TAP no BG 151/20 e republicação do TAP no BG 153/20.

**REPORT DO GERENTE:** em 31/12/2021 informa que 50% das viaturas de APH do CBMDF são totalmente reguladas junto a Central 192, sendo essas as viaturas do tipo Unidade de Resgate e Suporte Básico. Esta em processo de cadastro junto a Central 192 as demais viaturas de APH do CBMDF, as Unidades de Resgate - UR, para devida regulação médica das ocorrências. Ressalta-se que atualmente esta em vigor o plano de Despacho Imediato de Ocorrências com a devida regulação das mesmas no segundo momento pela Central 192, bem, como protocolo de Despacho para regulação de ocorrências de APH que adentrem via 193, e que não são classificadas como despacho imediato, para devida regulação junto a Central de Regulação.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** O projeto continua a ser estratégico e necessita obrigatoriedade de novos reports mensais no GPWeb.

**STATUS DO PROJETO:** Até a presente data o projeto consta em atraso.



72.92%

**PROJETO:** ATRASADO**Construção do 8º Grupamento Bombeiro Militar - 8º GBM - Ceilândia**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl KIN LIE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00047244/2019-11

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Início do projeto	Abertura de processo administrativo	CONCLUÍDA	5/3/2018	5/3/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	CONCLUÍDA	5/3/2018	7/12/2019
	- Previsão orçamentária	CONCLUÍDA	7/27/2018	10/4/2019
1 - EV - Estudo de Viabilidade Técnico Financeira	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	CONCLUÍDA	5/3/2018	10/4/2019
	1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	CONCLUÍDA	8/2/2018	3/27/2020
2.4 - Levantamento Arquitetônico	Levantamento As Built in loco	CONCLUÍDA	6/9/2018	6/25/2018
	Digitalização de As Built	CONCLUÍDA	6/25/2018	7/10/2018
	Correções As Built	CONCLUÍDA	7/10/2018	7/24/2018
3 - PN - Programa de Necessidades	3.1 - Entrevistas	CONCLUÍDA	6/10/2018	1/22/2019
	3.2 - Levantamento de Demandas	CONCLUÍDA	6/11/2018	1/25/2019
4 - EP - Estudo Preliminar	Proposta inicial	CONCLUÍDA	6/10/2018	7/9/2018
	Nova proposta	CONCLUÍDA	7/10/2018	7/31/2018
	Desenvolvimento	CONCLUÍDA	7/31/2018	8/31/2018
	Aprovação da proposta	CONCLUÍDA	9/15/2018	9/16/2018
	Fechamento da proposta	CONCLUÍDA	9/16/2018	10/1/2018
	Aprovação do Estudo Preliminar pelo Cmt	CONCLUÍDA	10/1/2018	10/5/2018
1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	- PARF	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
	- Previsão Orçamentária	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
Início de projetos	1.2 - Estudo de Viabilidade Financeira	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020
2 - LV - Levantamentos	2.4 - Levantamento Arquitetônico	CONCLUÍDA	6/9/2018	7/24/2018
	2.1 - TOP - Topografia	CONCLUÍDA	6/11/2018	6/25/2019
	2.2 - SDG - Sondagem	CONCLUÍDA	5/26/2019	9/24/2019
	2.3 - Concessionárias	CONCLUÍDA	7/26/2019	10/25/2019
- PARF	Início de projetos	ATRASADA	6/11/2018	1/25/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
5.1 - 1º Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	6/11/2018	10/20/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	10/20/2018	11/16/2018
1.1 - Estudo de Viabilidade Técnica	- Legislação urbanística	CONCLUÍDA	8/2/2018	12/30/2019
	Normas Técnicas e demais aplicáveis	CONCLUÍDA	8/2/2018	12/31/2019
	- Documentação Cadastral o imóvel	CONCLUÍDA	8/12/2018	3/27/2020
5.2 - 2ª Apresentação	Revisão	CONCLUÍDA	11/16/2018	11/19/2018
	Atendimento	CONCLUÍDA	11/19/2018	5/4/2019
6 - PL - Projeto Legal	6.2 - CBMDF - Consulta Prévia	CONCLUÍDA	1/27/2019	6/18/2019
	6.3 - SEGETH / CAP	CONCLUÍDA	6/7/2019	12/19/2019
	COMAER/CINDACTA	CONCLUÍDA	7/28/2019	9/6/2019
	CEB	CONCLUÍDA	5/22/2020	7/3/2020
7 - PE - Projeto Executivo	ARQ - Arquitetura e Urbanismo	CONCLUÍDA	1/27/2019	1/25/2020
	INC - Incêndio	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	INF - Infraestrutura	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	MEC - Instalações Mecânicas	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/26/2019
	ELE - Instalações Elétricas	CONCLUÍDA	6/28/2019	3/13/2020
	EST - Estrutura	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/7/2020
	FND - Fundações	CONCLUÍDA	9/27/2019	12/17/2019
	8.9 - PLO - Planilha Orçamentária	CONCLUÍDA	11/1/2019	12/10/2019
	8.10 - CRO - Cronograma Físico Financeiro	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	8.13 - MDE - Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	12/11/2019	1/25/2020
	8.11 - CET - Caderno de Especificações Técnicas	CONCLUÍDA	12/12/2019	1/25/2020
	8.12 - MEC - Memória de Cálculo	CONCLUÍDA	12/13/2019	1/25/2020
	8.14 - Projeto Básico de Licitação	CONCLUÍDA	12/24/2019	1/14/2020
5 - AP - Anteprojeto	5.1 - 1º Apresentação	CONCLUÍDA	6/11/2018	11/16/2018
	5.2 - 2ª Apresentação	CONCLUÍDA	11/16/2018	5/4/2019
	Aprovação do Anteprojeto pelas Autoridades	CONCLUÍDA	5/4/2019	5/5/2019
INF - Infraestrutura	Captação de Águas de Pluviais	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	Pavimentação	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
HID - Instalações Hidráulicas e Sanitárias	HID - Instalações Hidráulicas	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/25/2019
	SAN - Instalações Sanitárias	CONCLUÍDA	6/28/2019	10/19/2019
	IMP - Impermeabilização	CONCLUÍDA	9/27/2019	11/26/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
MEC - Instalações Mecânicas	Elevadores	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	ARC - Ar Condicionado	CONCLUÍDA	6/28/2019	11/26/2019
EST - Estrutura	Estrutura de Concreto Armado	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/7/2020
	Estrutura Metálica	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
Estrutura Metálica	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
Estrutura de Concreto Armado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/10/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/10/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/10/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/24/2019	1/7/2020
SON - Sonorização e CFTV	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/6/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/6/2019	12/24/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/24/2019	12/27/2019
RDL - Rede de Dados Lógicos	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	9/24/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/25/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/25/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/17/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	12/17/2019	12/31/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	1/10/2020	1/17/2020
ARQ - Arquitetura e Urbanismo	ARQ - Arquitetura	CONCLUÍDA	1/27/2019	1/18/2020
	ACE - Acessibilidade	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/25/2020
	PAI - Paisagismo	CONCLUÍDA	7/26/2019	10/25/2019
	Comunicação Visual	CONCLUÍDA	10/25/2019	1/25/2020
PAI - Paisagismo	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	7/26/2019	9/24/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/15/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/16/2019
	Quantitativos	CONCLUÍDA	10/15/2019	10/25/2019
SPDA	Dimensionamento SPDA	CONCLUÍDA	8/31/2019	11/30/2019



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
SPDA	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	9/6/2019	1/25/2020
	Quantitativo	CONCLUÍDA	11/30/2019	1/25/2020
INC - Incêndio	Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	SPDA	CONCLUÍDA	8/31/2019	1/25/2020
8 - ART's e RRT's	Emissão de ART's e RRT's	CONCLUÍDA	9/9/2019	10/10/2019
	Pagamento	CONCLUÍDA	10/10/2019	11/9/2019
	Emissão de ART's e RRT's registrada	CONCLUÍDA	11/9/2019	11/14/2019
ARC - Ar Condicionado	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/23/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/23/2019	9/23/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/23/2019	10/13/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	10/13/2019	10/28/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/28/2019	11/11/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	11/11/2019	11/26/2019
ELE - Instalações Elétricas	RDL - Rede de Dados Lógicos	CONCLUÍDA	6/28/2019	1/17/2020
	SON - Sonorização e CFTV	CONCLUÍDA	6/28/2019	12/27/2019
	ELE - Sistema Elétrico	CONCLUÍDA	9/30/2019	3/13/2020
SAN - Instalações Sanitárias	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/9/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/9/2019	9/17/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/17/2019	9/24/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/8/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/8/2019	10/8/2019
ARQ - Arquitetura	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	1/27/2019	11/22/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/16/2019
	Detalhamentos	CONCLUÍDA	11/22/2019	12/10/2019
	Quantitativos	CONCLUÍDA	12/10/2019	12/24/2019
	Memorial Descritivo	CONCLUÍDA	12/24/2019	12/31/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	12/31/2019	1/18/2020
HID - Instalações Hidráulicas	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	6/28/2019	7/26/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	7/26/2019	9/17/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	9/17/2019	9/24/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	9/24/2019	10/8/2019
	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019








ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
HID - Instalações Hidráulicas	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	10/8/2019	11/25/2019
Lançamento do sistema	Lançamento do sistema - luminotécnico	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Lançamento do sistema - tomadas gerais	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Lançamento do sistema - tomadas específicas (ar condicionado e demais)	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
FND - Fundações	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	9/27/2019	10/4/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	10/4/2019	10/25/2019
	Detalhamento	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/8/2019
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	11/8/2019	11/25/2019
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	11/25/2019	12/3/2019
	Memoriais	CONCLUÍDA	12/3/2019	12/17/2019
9 - PB - Projeto Básico	Elaboração do PES	CONCLUÍDA	11/1/2019	4/12/2020
	Encaminhamento para DIMAT	CONCLUÍDA	4/13/2020	4/14/2020
	Acompanhamento do processo	CONCLUÍDA	4/14/2020	10/5/2020
IMP - Impermeabilização	Projeto Executivo	CONCLUÍDA	9/27/2019	10/25/2019
	Quantitativo	CONCLUÍDA	10/25/2019	11/12/2019
	Caderno de Especificações	CONCLUÍDA	11/12/2019	11/26/2019
Sistemas de Combate a Incêndio e Pânico	Dimensionamento e Mapa de rota de fuga	CONCLUÍDA	4/26/2019	3/20/2020
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	1/18/2020	3/20/2020
	Quantitativo	CONCLUÍDA	1/18/2020	3/20/2020
ELE - Sistema Elétrico	Implantação (área externa) - edificação no lote	CONCLUÍDA	9/30/2019	10/19/2019
	Lançamento do sistema	CONCLUÍDA	10/12/2019	11/25/2019
	Dimensionamento do projeto	CONCLUÍDA	11/25/2019	1/29/2020
	Detalhamento	CONCLUÍDA	1/29/2020	2/12/2020
	Quantitativo do projeto	CONCLUÍDA	2/12/2020	2/27/2020
	Caderno de especificações	CONCLUÍDA	2/27/2020	3/6/2020
	Memoriais	CONCLUÍDA	3/6/2020	3/13/2020
Preparação para edital	Pedido de Execução de Serviços - Envio	CONCLUÍDA	4/13/2020	5/13/2020
	Projeto Básico	CONCLUÍDA	5/13/2020	5/18/2020
	Projeto Básico - Aprovação	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
Processo Licitatório	Abertura de processo licitatório	CONCLUÍDA	6/8/2020	6/8/2020
	Edital	CONCLUÍDA	6/8/2020	7/10/2020
	Aprovação do setor jurídico	CONCLUÍDA	6/25/2020	7/9/2020



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo Licitatório	Definição da modalidade de licitação	CONCLUÍDA	6/25/2020	6/25/2020
	Edital - Publicação	ATRASADA	7/15/2020	7/15/2020
	Adjudicação do vencedor da licitação	CONCLUÍDA	8/15/2020	8/17/2020
	Julgamento das propostas	ATRASADA	8/15/2020	8/17/2020
Aprovação de projeto na CEB	Aprovação de projeto na CEB	CONCLUÍDA	7/22/2020	7/22/2020
Ritos iniciais - Execução Contratual	Assinatura do Contrato	CONCLUÍDA	8/20/2020	8/20/2020
	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	8/30/2020	8/31/2020
	Alvará de Construção - Emissão	ATRASADA	9/1/2020	9/1/2020
	Ordem de serviço inicial	ATRASADA	9/3/2020	9/3/2020
Execução da obra	Serviços preliminares	ATRASADA	9/6/2020	5/6/2021
	Serviços complementares	ATRASADA	9/11/2020	9/11/2021
	Serviços auxiliares e administrativos	ATRASADA	9/11/2020	9/11/2021
	Fundações e estruturas	ATRASADA	9/11/2020	4/11/2021
	Impermeabilizações	ATRASADA	12/11/2020	7/11/2021
	Arquitetura e elementos de urbanismo	ATRASADA	12/11/2020	9/11/2021
	Instalações hidráulicas e sanitárias	ATRASADA	12/11/2020	9/11/2021
	Instalações elétricas e eletrônicas	ATRASADA	12/11/2020	9/11/2021
	Instalações mecânicas e de utilidades	ATRASADA	3/11/2021	8/11/2021
	Proteção contra incêndio e pânico	ATRASADA	3/11/2021	8/11/2021
	Equipamentos	ATRASADA	6/26/2021	9/11/2021
Recebimento da obra	Recebimento provisório	ATRASADA	9/11/2021	10/11/2021
	Recebimento definitivo	ATRASADA	10/11/2021	11/11/2021
	Habite-se	ATRASADA	11/12/2021	1/12/2022

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 80.00% (4/20/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**





20/04/2022

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 123/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 056/2021. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula com a nomeação publicada no BG n.º 056/2021.

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do gerente. contudo, foi realizada a 3ª medição no valor de R\$ 201.018,53. Desta forma, considera-se executado 15% da obra.

**REPORT DO GERENTE:** Em 24 de dezembro de 2021, A gerente de projeto fez seu último lançamento no GPWeb informando a 3ª medição no valor de R\$ 201.018,53.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** Podemos observar um cenário bastante otimista com relação ao andamento da construção do 8º GBM, destaque: Projetos aprovados, licitação realizada, contrato celebrado, apoio do governo local, relevante interesse social e alinhamento entre GDF e Comando do CBMDF.

**STATUS:** o projeto apresenta o status EM ATRASO por falta de reports.

**PROJETO:****ATRASADO**

14.89%

**Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00063193/2019-67

ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Processo de Contratação de Empresa de Projetos	Autuação do Processo	CONCLUÍDA	12/10/2013	12/10/2013
	Assinatura do Contrato	CONCLUÍDA	5/6/2016	5/6/2016
Projetos	Ordem de serviço 1	CONCLUÍDA	6/23/2016	6/23/2016
	Apresentação do Partido Arquitetônico	CONCLUÍDA	7/22/2016	7/22/2016
	Ordem de Serviço 2 - Projeto de Arquitetura	CONCLUÍDA	8/2/2016	8/2/2016
	Anteprojeto	CONCLUÍDA	9/22/2016	9/22/2016
	Projeto arquitetônico	CONCLUÍDA	12/2/2016	1/30/2019
	Projetos complementares de engenharia	CONCLUÍDA	1/30/2019	1/30/2019
Processo Licitatório	Encaminhamento de Projeto Básico para Licitação	CONCLUÍDA	4/2/2019	4/2/2019
	Elaboração do Edital	CONCLUÍDA	7/24/2019	6/10/2020
	Declaração de Orçamento	CONCLUÍDA	5/15/2020	5/15/2020
	Edital de Licitação publicado	CONCLUÍDA	6/16/2020	3/24/2021
	Habilitação dos Licitantes	CONCLUÍDA	2/1/2021	2/22/2021
	Julgamento da proposta	CONCLUÍDA	2/22/2021	3/3/2021
	Homologação e Adjudicação ao vencedor	CONCLUÍDA	3/3/2021	3/4/2021
	Contratação da empresa executora da obra	CONCLUÍDA	3/4/2021	3/4/2021
Execução dos serviços - Ritos Iniciais	Alvará de Construção	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/30/2020
	Comissão Executora - Publicação	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/17/2020
	Ordem de Serviço Inicial	CONCLUÍDA	6/17/2020	6/17/2020
Execução da Obra - Etapa 1	Disposições Gerais	ATRASADA	9/1/2020	8/30/2022
	Serviços Preliminares	ATRASADA	9/1/2020	1/1/2021
	Limpeza da obra	ATRASADA	9/1/2020	8/30/2022
	Fundações e Estrutura	ATRASADA	11/1/2020	7/30/2021
	Instalações	ATRASADA	3/1/2021	8/1/2022



ETAPAS	ATIVIDADES	STATUS	DATA DE INÍCIO	DATA DE TÉRMINO
Execução da Obra - Etapa 1	Alvenarias e divisões	ATRASADA	4/1/2021	11/1/2021
	Revestimentos	ATRASADA	9/1/2021	7/30/2022
	Esquadrias em geral	ATRASADA	10/1/2021	5/4/2022
	Pisos	ATRASADA	11/1/2021	9/1/2022
	Coberturas e proteções	ATRASADA	12/1/2021	6/28/2022
	Pintura	ATRASADA	2/1/2022	8/1/2022
	Pavimentação externa e urbanização	ATRASADA	4/1/2022	7/29/2022
	Bancadas, louças, metais e acessórios	ATRASADA	5/1/2022	8/1/2022
	Serviços Complementares	ATRASADA	7/1/2022	8/1/2022
	Comunicação Visual	ATRASADA	7/1/2022	8/3/2022
	Paisagismo	ATRASADA	7/1/2022	8/3/2022
Execução da Obra - Etapa 2	Disposições Gerais	ATRASADA	9/1/2022	9/1/2024
	Limpeza da obra	ATRASADA	9/1/2022	9/1/2024
	Serviços Preliminares	ATRASADA	9/1/2022	12/1/2022
	Fundações e Estrutura	A INICIAR	11/1/2022	9/1/2023
	Instalações	A INICIAR	5/20/2023	9/1/2024
	Alvenarias e Divisões	A INICIAR	7/1/2023	3/1/2024
	Revestimentos	A INICIAR	10/1/2023	7/1/2024
	Esquadrias em geral	A INICIAR	11/1/2023	5/4/2024
	Pisos	A INICIAR	12/1/2023	9/1/2024
	Coberturas e proteções	A INICIAR	1/1/2024	7/1/2024
	Pintura	A INICIAR	2/1/2024	9/1/2024
	Pavimentação externa e urbanização	A INICIAR	4/1/2024	7/1/2024
	Bancadas, louças, metais e acessórios	A INICIAR	5/1/2024	9/1/2024
	Paisagismo	A INICIAR	7/1/2024	8/1/2024
	Serviços Complementares	A INICIAR	7/1/2024	8/1/2024
Comunicação Visual	A INICIAR	8/1/2024	9/1/2024	
Recebimento da Obra	Provisório	A INICIAR	9/15/2024	9/30/2024
	Definitivo	A INICIAR	11/1/2024	12/9/2024
	Habite-se	A INICIAR	1/1/2025	3/30/2025



ADESÃO À METODOLOGIA					
 80.00% (4/19/2022)	ITEM	STATUS		ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓		Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓		PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓		Reports atualizados	✗
SIM	NÃO	NÃO SE APLICA	NÃO APURADO		

### ULTIMO REGISTRO DO PROJETO

16/08/2021

Projeto "Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral (QCG)" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP BG 123/20\_TAP, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2022 e permaneceu assim no BG 228/20\_entrega 21, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Construção do Anexo II - Quartel do Comando Geral " saindo a abreviatura QCG. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES.

Dados do gerente atual: TEn.CEL. QOBM/Comb. ISAAC DA SILVA BARBOSA, nomeada por meio do BG 056/21.

Dados de execução do projeto: A aprovação de TAP foi publicada no BG 123/20 conforme adesão à metodologia. O projeto possui EAP, cronograma, detalhes e demais artefatos no GPWeb. Projeto encontra-se atrasado conforme cronograma e o último report. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.

Último Report do gerente em 09/08/2021: Informa que foi iniciada a limpeza do terreno e instalação do canteiro de obras. O report anterior fala que ocorreu a emissão da ordem de serviço.

Análise do supervisor: As próximas tarefas estão relacionadas à fase de "Execução dos serviços" - Ritos Iniciais. Já ocorreu a Emissão do alvará de construção conforme documento 66390454 do processo SEI 00053-00063193/2019-67, e no dia 09/08/2021 foi realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Anexo II do Quartel do Comando Geral.

Status do projeto: ATRASADO.



94.79%

**PROJETO:**

ATRASADO

**Construção do Canil Militar de Busca e Resgate com Cães**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl KIN LIE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00094716/2019-17

**ADESÃO À METODOLOGIA**

 80.00% (4/20/2022)	ITEM	STATUS	ITEM	STATUS
	Existe Gerente	✓	Existe TAP	✓
	Existe EAP	✓	PLASE publicado	—
	Custo estimado	✓	Reports atualizados	✗
 SIM	 NÃO	 NÃO SE APLICA	 NÃO APURADO	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

20/04/2022

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 056/2021, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula com a nomeação publicada no BG n.º 056/2021.

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** O projeto encontrasse com status EM ATRASO por falta de reports por parte do gerente. contudo, Aguardando análise jurídica quanto à minuta do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2020, conforme documento 72438046, processo SEI 00053-00117765/2021-50.

**REPORT DO GERENTE:** Em 20/10/2021, a gerente de projeto fez seu último report no GPWeb.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** Projeto paralizado porém em estado bem avançado de execução. Tão logo cesse o motivo da paralização ocorrerá o término dos últimos 5,21% restante da execução.

**STATUS:** o projeto apresenta o status EM ATRASO.

**PROJETO:**

ATRASADO

4.27%

**Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural)**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl KIN LIE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00023776/2020-99

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022

Dados de oficialização do projeto: Projeto aprovado por meio de aprovação do TAP no BG 098/20 e mantido na condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.

Dados do gerente atual: MAJ QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimaraes

Dados de execução do projeto: O projeto encontra-se com 4,49% da execução prevista realizada. A maioria das etapas previstas não foram iniciadas. As etapas de confecção do projeto executivo (12% executado), de Estudo Preliminar (69%) e da Solicitação de cessão do terreno (46% de execução) são as que foram executadas parcialmente até o momento. As demais apresentam percentual de 0,0% de execução.

Os principais problemas apontados pela gerente do projeto para dar continuidade à execução estão relacionados à cessão do terreno para o CBMDF.

Report do gerente: O último report apresentado pela gerente data de 09/11/2021 informando que os processos de tramitação para definição de área destinada ao CBMDF estão contidas nos processos SEIs 0390-000397/2012, 00306-00000648/2020-30 e 00053-00043899/2020-46.

Análise do supervisor: Foi identificado que o nome publicado do projeto apresenta erroneamente a denominação da unidade de acordo com o regimento interno. Porém, existe um organograma que difere do RI sendo o que gerou a troca de nomes dos projetos. A denominação aprovada no BG 056/21 é 40º Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural) enquanto o RI informa que essa unidade é o 42º GBM - Setor "P" Sul de Ceilândia. Sugere-se que este equívoco seja corrigido na próxima publicação que trate dos projetos estratégicos.

Também sugere-se que o Comando da Corporação atue de modo mais incisivo junto aos órgãos responsáveis pela Cessão do terreno ao CBMDF, bem como, avalie a possibilidade de ajuda de parlamentares e de autoridades do executivo para "destravar" a cessão do terreno.

Status: PROJETO ATRASADO



8.75%

**PROJETO:**

ATRASADO

**Construção do Grupamento de Bombeiro Militar - Sol Nascente**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl KIN LIE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00023776/2020-99

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022

Dados de oficialização do projeto: Projeto aprovado por meio de aprovação do TAP no BG 098/20 e mantido na condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.

Dados do gerente atual: MAJ QOBM/Compl. Isa Paula Correa Guimaraes

Dados de execução do projeto: O projeto encontra-se com 8,31% da execução prevista realizada. A maioria das etapas previstas não foram iniciadas.

O terreno já foi incorporado à carga do CBMDF e o PES encaminhado à DIMAT para subsidiar a licitação.

Report do gerente: O último report apresentado pela gerente em 03/11/2021, informa o encaminhamento do à DIMAT, conforme documento 66075289 do processo SEI 00053-00047052/2020-31 e que o COMAP está acompanhando a aprovação ou a necessidade de possíveis adequações do PES.

Análise do supervisor: Foi identificado que o nome publicado do projeto apresenta erroneamente a denominação da unidade de acordo com o regimento interno. Porém, existe um organograma que difere do RI sendo o que gerou a troca de nomes dos projetos. A denominação aprovada no BG 056/21 é 40º Grupamento de Bombeiro Militar - SCIA (Estrutural) enquanto o RI informa que essa unidade é o 42º GBM - Setor "P" Sul de Ceilândia. Sugere-se que este equívoco seja corrigido na próxima publicação que trate dos projetos estratégicos.

Por tratar-se de um projeto estratégico sugere-se que o PES e demais artefatos para licitar os serviços necessários ganhe prioridade na tramitação.

Status: PROJETO ATRASADO

**PROJETO:**

PARALISADO

78.55%

**Construção do Grupamento de Proteção Ambiental - GPRAM**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl KIN LIE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00067499/2017-21

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

06/08/2021

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado no BG n.º 084/2020. O projeto consta na última relação de projetos estratégicos conforme publicação no BG n.º 056/2021, nesse ato não foi nomeado Supervisor. Projeto lançado no GPWeb com os devidos artefatos e etapas descritas na EAP.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** MAJ. QOBM/Compl. Isa Paula com a nomeação publicada no BG n.º 056/2021.

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** Conforme último report da gerente realizado em 01/05/2021, o projeto encontra-se com as atividades paralisadas desde 13/04/2021, conforme documento 59602853, processo SEI 00053-00067499/2017-21, até que haja autorização da DICOA para reinício, para tanto deve ser concluída a análise dos pedidos de aditivos.

**REPORT DO GERENTE:** A gerente do projeto fez seu último report no GPWeb em 01/05/2021 onde a comissão executora do contrato emite Ordem de Serviço notificando à contratada da paralização das atividades de execução da obra do GPRAM.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** Projeto paralizado porém em estado avançado com 78,55% de execução. Tão logo sejam realizadas as análises técnicas e jurídicas deverá ocorrer o término da obra.

**STATUS:** Em 06/08/2021 o projeto apresenta o status PARALISADO.



**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

68.21%

**Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	06. Garantir a infraestrutura apropriada às atividades operacionais e administrativas.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	06.01 Construir unidades de ensino, apoio e direção
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl KIN LIE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00022424/2020-16

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

20/04/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Construção do Novo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças - CEFAP, inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação do seu TAP no BG 123/20\_TAP, continuou inserido no PLANES no BG 195, de 16 de outubro de 2020, com entrega para 2020 e permaneceu assim no BG 228/20\_entrega 20, e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto "Construção do novo CEFAP" saindo o nome por extenso. O projeto está relacionado à iniciativa 6.1 do PLANES. Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ QOBM/Compl. ISA PAULA CORREA GUIMARÃES, conforme BG 056/21.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: TAP aprovado e publicada no BG 123/20 conforme adesão à metodologia. Possui também EAP, cronograma e demais artefatos no GPWeb. O projeto encontra-se atrasado conforme cronograma.

REPORT DO GERENTE: Último report em 31/12/2021 onde é informado que foi realizada a 1ª medição no valor de R\$ 582.999,72, conforme documento 76812351, processo SEI 00053-00159149/2021-76. Desta forma, considera-se executado 4% da obra.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O projeto continua a ser estratégico e necessita obrigatoriedade de novos reports mensais no GPWeb.

STATUS DO PROJETO: ATRASADO no GPWeb.

**PROJETO:**

ATRASADO

0.00%

**Credenciar o CBMDF como Instituição de Ensino Superior**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	10. Desenvolver pesquisas e a gestão do conhecimento.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	10.02 Oportunizar cursos de mestrado e doutorado na área de segurança contra incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	GABCG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb Setúbal
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** A aprovação do projeto estratégico foi feita por meio do BG 195/2020 e mantido na condição de estratégico por meio do BG 056/21, portanto em acompanhamento especial.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** TC QOBM/Comb. Júlio César Vasques Setúbal

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** Não há nenhum report do projeto na ferramenta de gestão de projetos GPWeb.

**REPORT DO GERENTE:** Não há nenhum report informação sobre execução do projeto na ferramenta de gestão de projetos GPWeb.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** Inicialmente o gerente do projeto designado foi o TC QOBM/Comb. Célio Wilson e tinha o nome "Aprovar junto ao MEC o CBMDF como IES".

O BG 056/21 designou novo gerente, TC QOBM/Comb. Setúbal e alterou o nome do projeto para "Credenciar o CBMDF como IES".

Até o presente momento não houve confecção de TAP e de EAP, o que indica que não houve planejamento ou execução do projeto registrado no GPWeb

Sugere-se que o gerente faça a reclassificação do relacionamento estratégico do projeto e que seja inserido na ferramenta GPWeb a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e atualizados os reports de execução. A falta destas informações impacta na medição da adesão à metodologia e na medição do desenvolvimento do projeto.

**STATUS:** Projeto ATRASADO



100.00%

**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Implantação da Gestão de Riscos na DITIC.**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	04. Consolidar a governança corporativa.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	04.01 Definir política e diretrizes para o sistema de gestão de riscos e controle interno e implantá-lo
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DITIC
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Comb Silva Mendonça
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

20/04/2022  
DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Implantar a Gestão de Riscos - DITIC" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 56, de 24 de março de 2021.  
DADOS DO GERENTE ATUAL: CAP QOBM/Comb. Ramon com a nomeação publicada no BG n.º 189/2021.  
DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O projeto encontrasse com status EM ANDAMENTO, contudo apresenta por falta de reports atualizados por parte do gerente.  
REPORT DO GERENTE: Em 21/02/2022, a gerente de projeto fez seu último report no GPWeb solicitando à CGDF o cadastramento dos proprietários dos riscos da DITIC para uso do SAEWEB.  
ANÁLISE DO SUPERVISOR: Projeto em estado bem avançado de execução.  
STATUS: o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.



75.47%

**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

**Implantação da Gestão de Riscos no DERHU.**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DERHU
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb Nilsa
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**



**PROJETO:**

CONCLUÍDO

**Implantação da Gestão de Riscos no DESEG.**

100.00%

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DESEG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb ROBSON MACHADO
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

16/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: "Implantação da Gestão de Riscos no DESEG. " inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação de seu TAP no BG 052, de 18 de março de 2021, com entrega para 2021 e continuou na categoria PLANES no BG 056/21 quando se tornou o projeto Implantar a Gestão de Riscos - DESEG". Este projeto encontra-se com acompanhamento especial, pois consta da lista de projetos estratégicos publicada no BG 56/2021.O e está relacionado à iniciativa 2.4 do PLANES.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Cel. QOBM/Comb. ROBSON DELFINO MACHADO, matr. 1399994, Diretor de Investigação de Incêndio, conforme Boletim Geral 130, de 13 de julho de 2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Projeto concluído, teve seu TAP aprovado no BG BG 052, conforme adesão à metodologia. Existe a EAP no GPWeb e demais artefatos como cronograma e detalhes do projeto. Houve substituição do Ten-Cel. QOBM/Comb. CÉLIO WILSON RODRIGUES, matr. 1399992 pelo gerente atual no Boletim Geral 130, de 13 de julho de 2021.

REPORT DO GERENTE: Último report em 10/08/2021 que informa que foram lançados no SAEWEB os controles e demais elementos constantes do Plano de Implantação das Ações de Controle do DESEG.

REPORT DA SUPERVISÃO: O projeto está completamente concluído e dentro do prazo planejado tendo recebido todo o suporte do supervisor.

STATUS DO PROJETO: CONCLUÍDO.



98.42%

**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

**Implantação do Sistema SCIPWEB**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.01 Implementar a Política de Segurança contra incêndio
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DESEG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Comb FEDERICO BAIGORRI
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00002583/2018-80

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

29/08/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 137/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: MAJ. QOBM/Comb. Pablo Federico Baigorri com sua nomeação publicada em BG n.º 111/2022.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: o projeto se encontra em fase final de entrega.

REPORT DO GERENTE: em 27 de julho de 2022, o gerente de projeto fez seu último lançamento informando que não houve avanço quanto a solução da demanda enviada à equipe do SISLANCA. E que Continua aguardando solução a ser implementada pelo setor.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: O referido projeto transcorre dificuldade aparente junto à equipe do SISLANCA.

STATUS: Apesar do cronograma ainda não ter sido cumprido, o projeto apresenta o status EM ANDAMENTO.



**PROJETO:**

PARALISADO

0.00%

**Implantar a Gestão de Riscos - DISAU**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	02. Ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndio e incidentes.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	02.04 Desenvolver a gestão de riscos operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DISAU
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	CEL QOBM/Comb EDIMAR
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

16/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto "Implantar a Gestão de Riscos - DISAU" inserido no PLANES 2017-2024 por meio da publicação no BG 56, de 24 de março de 2021.

DADOS DO GERENTE ATUAL: Ainda não tem, será nomeado por meio do TAP.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: Projeto a iniciar com previsão de início para 23/08/2021.

REPORT DO GERENTE: não se aplica, projeto a iniciar.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: não se aplica, projeto a iniciar.

STATUS DO PROJETO: a iniciar.

**PROJETO:**

PARALISADO

55.91%

**Implementar o Relatório de Ocorrências Operacionais - RAD**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.04 Mapear, melhorar e definir indicadores de desempenho para os processos finalísticos
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	2ºSGT QOBM/RRm HENRIQUE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00065261/2020-66

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022

**DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO:** Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.

**DADOS DO GERENTE ATUAL:** 2º SGT RRm Henrique com sua nomeação publicada em BG n.º 146/2020. O referido Gerente pediu exoneração da PTTC em julho de 2021.

**DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:** o projeto encontra-se atrasado em sua estrutura atual (EAP), contudo o fato é atribuído a mudanças quanto a ferramenta de desenvolvimento. Gerando dessa forma, a necessidade de aprendizado e assimilação de novos conhecimentos por parte da equipe do CBMDF. Até o presente momento, o módulo de incêndio florestal encontrasse em fase de teste e adequações.

**REPORT DO GERENTE:** tendo em vista que o antigo gerente pediu exoneração da PTTC e em virtude do 2º SGT Darlan da DITIC encontrar-se de férias, nenhuma outra informação pôde ser levantada até presente data.

**ANÁLISE DO SUPERVISOR:** reforçando os dados de execução do projeto, ficou constatado que a mudança de ferramenta de desenvolvimento gerou atraso considerável à execução do projeto como um todo. Contudo, essa mudança é vista como positiva por este supervisor pois cria uma maior integração e alinhamento entre as ferramentas de desenvolvimento do CBMDF e a SUTIC do GDF, promovendo também uma iteração consistente e planejada entre os futuros sistemas desta corporação.

É importante relatar também que em 11/05/2021 no DODF n.º 087/2021, foi criado o Grupo de Trabalho (GT) de integração do SGO, que tem como objetivo de estabelecer interoperabilidade entre os registros dos diversos sistemas de atendimento emergencial de segurança pública. Tal fato tem fomentado por parte desse GT, a possibilidade de adquirir ou reformular a estrutura de registros de ocorrências utilizadas pelo CBMDF. Dessa forma, este supervisor enxerga a possibilidade de problemas quanto a implementação de novos módulos de relatórios do RAD.

Este supervisor aponta a necessidade de substituição do atual gerente para o 2º SGT Darlan da DITIC, tendo em vista que o antigo gerente pediu exoneração da PTTC. Informo ainda que em virtude de inconsistências de dados cadastrados dentro do sistema de origem SGO-FÊNIX, esta sendo reestruturado nova base de dados para correção do dado antes da complementação.

**STATUS:** Em 19/04/2022 o projeto apresenta o status ATRASADO.





60.45%

**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

**Implementar o sistema de comunicação digital/crítica(Rádio Digital)**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	07. Modernizar o atendimento e despacho operacional.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	07.01 Modernizar o sistema de rádio comunicação (voz, dados e localização)
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	DITIC
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/RRm LOPES
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00050246/2022-85

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

20/04/2022

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pelo Comandante Geral e publicado em BG n.º 146/2020.

DADOS DO GERENTE ATUAL: CEL QOBM/Comb. DiasMaia com sua nomeação publicada em BG n.º 203/2021.

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: O referido projeto até a presente data não possui qualquer informação de sua execução junto ao GPWEB, embora tem-se conhecimento de sua execução.

REPORT DO GERENTE: O referido projeto não possui nenhum report realizado por parte de seu Gerente de Projeto.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Nada a informar.

STATUS: O projeto apresenta o status EM ATRASO.



76.41%

**PROJETO:**

ATRASADO

**Projeto de Lei Bombeiros Temporários**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.01 Realizar concurso público de ingresso na Corporação
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	EMG
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	TEN CEL QOBM/Comb ANIBAL
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022

Dados de oficialização do projeto: Projeto aprovado por meio do BG 195/20.

Dados do gerente atual: TC QOBM/Comb. Pedro Aníbal Caixeta

Dados de execução do projeto: O projeto está sendo executado no processo SEI 00053-00094667/2020-56 e encontra-se com 76,41% da execução prevista realizada.

Report do gerente: O último report, de 05/04/2021, foi confeccionado pelo supervisor do projeto e informa que a proposta foi consolidada no memorando 116(52324539) e encaminhada ao Chefe do EMG em 09/12/2020.

Análise do supervisor: Sugere-se que o projeto seja encaminhado a outras instâncias de avaliação e aprovação interna.

Status: PROJETO ATRASADO



44.20%

**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

**Reforma do 16º Grupamento Bombeiro Militar - 16º GBM - Gama**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl KIN LIE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00044902/2020-49

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022

Projeto de reforma do 16º GBM - Gama

Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do 16º GBM - Gama

Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

Dados de execução do projeto: - BG 137/2020.

Report do gerente: Acompanhamento especial - BG 56/2021. A gerente reporta que o projeto básico corrigido e encaminhado para licitação, conforme documento 82877426, processo SEI 00053-00046948/2022-64.

Análise do supervisor: Nada a relatar.

Status: PROJETO EM ANDAMENTO

**PROJETO:**

EM ANDAMENTO

60.98%

**Reforma do 1º Grupamento Bombeiro Militar - 1º GBM - Brasília**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl KIN LIE
<b>PROCESSO SEI</b>	00053-00092407/2017-41

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022

Projeto de reforma do 1º GBM - Brasília

Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do 1º GBM - Brasília

Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

Dados de execução do projeto: - BG 84/2020.

Report do gerente: Informação do pagamento da 16a medição no valor de R\$ 74.929,69 conforme documento 76673562 do processo SEI 00053-00216867/2021-57.

Considera-se executada 53% da obra

Análise do supervisor: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

Status: PROJETO EM ANDAMENTO



**PROJETO:**

ATRASADO

0.39%

**Reforma do 22º Grupamento Bombeiro Militar - 22º GBM - Sobradinho**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl KIN LIE
<b>PROCESSO SEI</b>	A DEFINIR

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

19/04/2022

Projeto de reforma do 22º GBM - Sobradinho

Dados de oficialização do projeto: Projeto de Reforma e Ampliação do 22º GBM - Sobradinho

Dados do gerente atual: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

Dados de execução do projeto: - BG 137/2020.

Início: 17/04/2020

Término: 28/12/2023

Report do gerente: O último report realizado pelo gerente em 29/10/2021 informando a finalização de correções do as built pela seção de projetos do COMAP.

Análise do supervisor: Recomenda-se que a gerente atualize os dados e andamento das tarefas e atividades do projeto.

Status: Projeto se encontra ATRASADO.

**PROJETO:**

PARALISADO

48.75%

**Reforma do Centro de Treinamento Operacional - CETOP**

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	01. Atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais.
<b>INICIATIVA ESTRATÉGICA</b>	01.05 Construir e reformar de unidades operacionais
<b>SETOR RESPONSÁVEL</b>	COMAP
<b>GERENTE RESPONSÁVEL</b>	MAJ QOBM/Compl KIN LIE
<b>PROCESSO SEI</b>	

**ULTIMO REGISTRO DO PROJETO**

12/08/2021

DADOS DE OFICIALIZAÇÃO DO PROJETO: Projeto de Reforma e Ampliação do CETOP

DADOS DO GERENTE ATUAL: Maj. Isa Paula Correa Guimarães

DADOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO: - BG 137/2020.

Início: 05/02/2021

Término: 25/04/2024 - Recebimento da obra.

REPORT DO GERENTE: Na EAP, na etapa de 10/06/2020, a gerente reporta que: No Processo SEI de aprovação de projeto junto a CAP 00053-00052204/2018-01, documento de exigências de alvará de construção 37768051. FALTA EMITIR ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO (processo alterado pelo decreto Decreto Nº 40.558, de 24 de março de 2020).

280421 Projeto será retomado para adequações da área externa e reforma das torres, conforme prioridade definida pelo Plano de Obras e Planejamento Estratégico. 28/04/2021. 260521 A iniciar compatibilização de projetos. 26/05/2021.

ANÁLISE DO SUPERVISOR: Recomenda-se que a gerente registre um report atualizado.

STATUS DO PROJETO: PROJETO PARALIZADO
